

Pågående arbeten vecka 27



Denna vecka har bjälklag BÖP3 gjutits. Rivningsarbeten med yttertakets fortsätter så att stålkonstruktionen till bjälklag BÖP4 kan påbörjas.

Stålförstärkningar utförs vid södra tegelväggen och norra fasaden.

Betongarbeten bestående av undergjutningar av stålpelare/stålbalkar och igengjutningar av genomföringar i betongbjälklag pågår.

Ombyggnad av fasaden mot M15 förbereds genom rivning av plåtfasad.

Installationsarbeten fortsätter på plan 3-5.

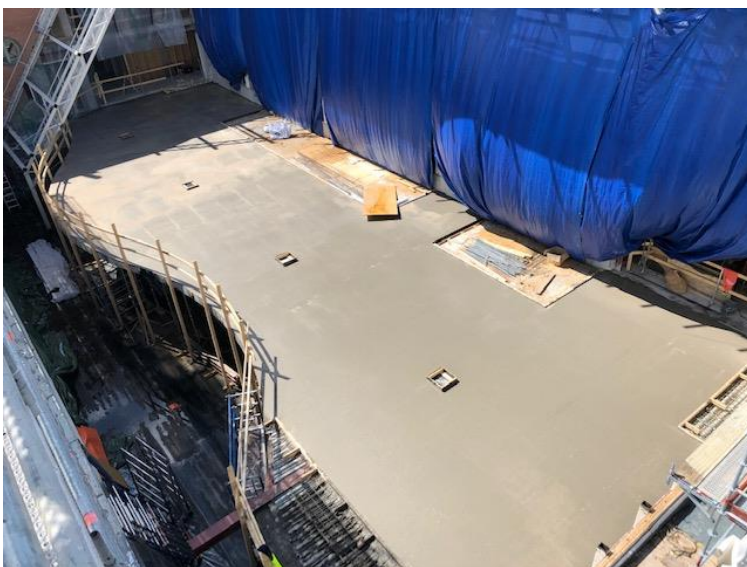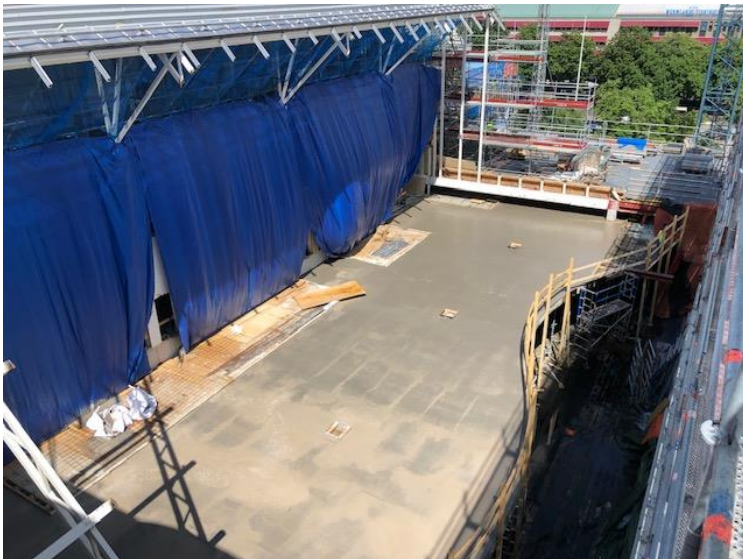

Mvh Henric Granberg

