

Pågående arbeten vecka 39


Rivningsarbeten på Plan 6 fortsätter vid bef kylmaskinrum. Håltagning för installationer i betongbjälklag Plan 3-6 pågår. Rivningsarbeten på Plan 0 för ny ledningdragning påbörjas.

Takplåten kommer att börja monteras under veckan. Arbeten med gipsinnerväggar fortsätter på Plan 3-5. Betongarbeten pågår vid fasadpelarna och på Plan 3-6. Rivning och håltagning för byggstål och installationer utförs på Plan 3-6 samt en del utvändigt. Brandskyddsinklädnad på stålkonstruktion utförs på Plan 3-5.

Stålkonstruktionen kompletteras på takplan mot bef. byggnad.

Installationsarbete fortsätter på Plan 3-5. Installationer har påbörjats i nya bjälklaget på Plan 3-4.

Under veckan kommer det att pågå störande arbeten 06.45-16.00. Om någon övertid utförs meddelar vi det.

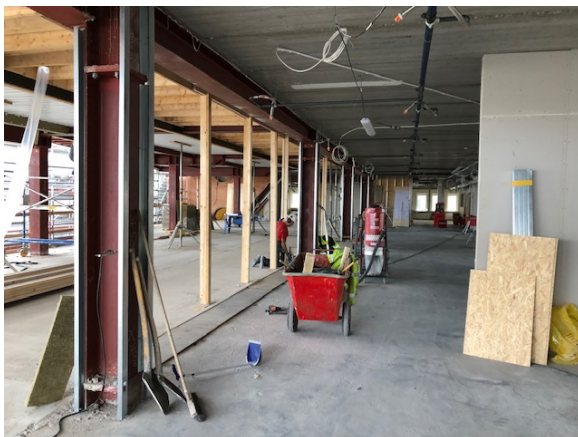



Mvh Henric Granberg
