

### **Pågående arbeten vecka 41**


Monteringen av takplåten är i slutfasen. Tillverkning och montering av taksarg tar vid under veckan. Montage av gipsinnerväggar fortsätter på Plan 3 del 1 och schaktväggar på Plan 3-5 linje B4 monteras i takt med att ventinstallationer blir färdiga. Betongarbeten vid trapphål Plan 4-6 linje A3 pågår. Brandsyddsinklädning utförs på Plan 3-5.

Rivningsarbeten på Plan 0 fortsätter och håltagning Plan 3-6 för installationer pågår löpande under veckan.

Arbete med installationer på Plan 3-6 pågår för fullt.

Glasfasaden kommer att påbörjas denna vecka.

Ställning vid Norra Fasaden kompletteras invärdigt.

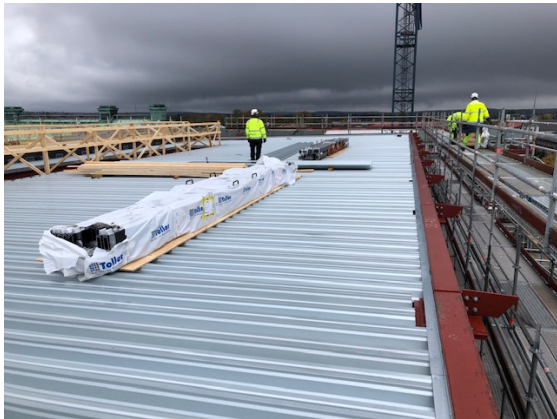

Mvh Henric Granberg
