

Pågående arbeten vecka 42


Montering av Glasfasad har startat med montage av alu-profiler innan glaset lyfts på plats.

Arbeten med gipsinnerväggar fortsätter på Plan 3 del 1. Även schaktväggar monteras på Plan 3-5. Arbeten vid trapphål fortsätter i linje A3 Plan 4. Brandskyddsinklädnad fortsätter på Plan 4-5. Ytterväggar kompletteras med för montage av Glasfasad. Takarbeten fortsätter med sargar och inklädnader.

Måleriarbeten har startat med målning av fasadpelare och spackling av bef ytterväggar.

Håltagning för genomföringar av installationer pågår även denna vecka.

Installationsarbete pågår löpande under hela byggtiden.

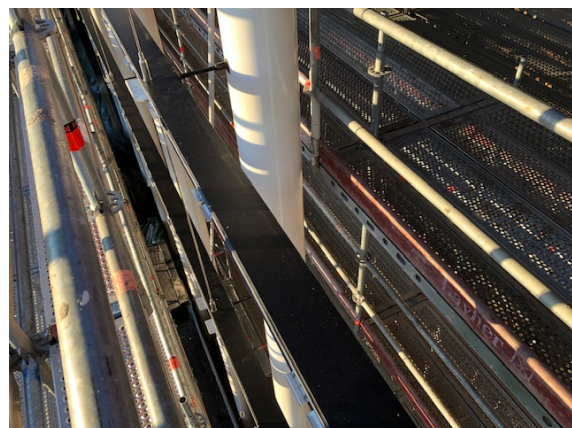

Mvh Henric Granberg
